



การบริหารจัดการงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2562

ข้อมูลจากโปรแกรมติดตามงบประมาณ กองบริหารการสาธารณสุข
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 23.05 น.



สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

- **ครุภัณฑ์** **980 หน่วย**
วงเงิน 384,436,700 บาท
- **สิ่งก่อสร้าง** **106 หน่วย (คืบหน้า 6 หน่วย)**
(ปีเดียว) วงเงิน 482,353,300 บาท (10,393,400 บาท)
- **สิ่งก่อสร้าง** **2 หน่วย**
(ผูกพัน) วงเงิน 148,789,300 บาท



รายการคืบงบประมาณ

ปี 2562

หน่วยบริการ	ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	สาเหตุคืบงบ
รพ.ปะเหลียน (จ.ตรัง)	1.	ระบบบำบัดน้ำเสีย <u>วงเงิน 3,500,000 บาท</u>	1	มีปัญหาเรื่องแบบแปลนที่ไม่ ผ่านการรับรองตามระเบียบ ของกฎหมาย
รพ.สต.วังวน (จ.ตรัง)	2.	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร <u>วงเงิน 2,983,400 บาท</u>	1	ต้องก่อสร้างในสถานที่เดิม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ เห็นชอบให้รื้อถอนอาคารเดิม

รายการคืบงบบประมาณ

ปี 2562

หน่วยบริการ	ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	สาเหตุคืบงบบ
รพ.สต.วัดจันทร์ (จ.สงขลา)	3.	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) <u>วงเงิน 3,352,700 บาท</u>	1	ได้รับจัดสรรผิดแบบแปลน ทำให้ ไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ที่ขอได้ (ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขจาก กบรส.)
สสอ.ควนเนียง (จ.สงขลา)	4.	รั้วคอนกรีตบล็อก ความยาว 93 เมตร <u>วงเงิน 140,800 บาท</u>	1	ได้รับจัดสรรผิด ตามแบบคำขอ ขนาดความยาว 44 เมตร ได้รับ จัดสรรเป็น 93 เมตร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ (ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขจาก กบรส.)

รายการค้ำงบประมาณ

ปี 2562

หน่วยบริการ	ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	สาเหตุค้ำงบ
สสอ.สะบ้าย้อย (จ.สงขลา)	5.	รั้วคอนกรีตบล็อก ความยาว 99 เมตร วงเงิน <u>159,800 บาท</u>	1	ได้รับจัดสรรผิด ตามแบบคำขอ ขนาดความยาว 47 เมตร ได้รับ จัดสรรเป็น 99 เมตร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ (ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขจาก กบรส.)
สสอ.เทพา (จ.สงขลา)	6.	รั้วคอนกรีตบล็อก ความยาว 150 เมตร วงเงิน <u>256,700 บาท</u>	1	ได้รับจัดสรรผิด ตามแบบคำขอ ขนาดความยาว 76 เมตร ได้รับ จัดสรรเป็น 150 เมตร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ (ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขจาก กบรส.)

ความก้าวหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง(ผูกพัน)


ปี 2562

หน่วยบริการ	รายการ	งวดงาน	ความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค
รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น <u>วงเงิน 121,655,900 บาท</u>	-	อยู่ระหว่างขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะก่อสร้าง	ยังส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างยังไม่ได้ (คาดว่าส่งมอบ) * 15 พ.ย.62 *
รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น <u>วงเงิน 27,133,400 บาท</u>	-	อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารเก่า	ยังส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างยังไม่ได้ (คาดว่าส่งมอบ) * พ.ย.62 *

ผลการเบิกจ่ายเงิน (GFMS)

งบลงทุน

ปี 2562

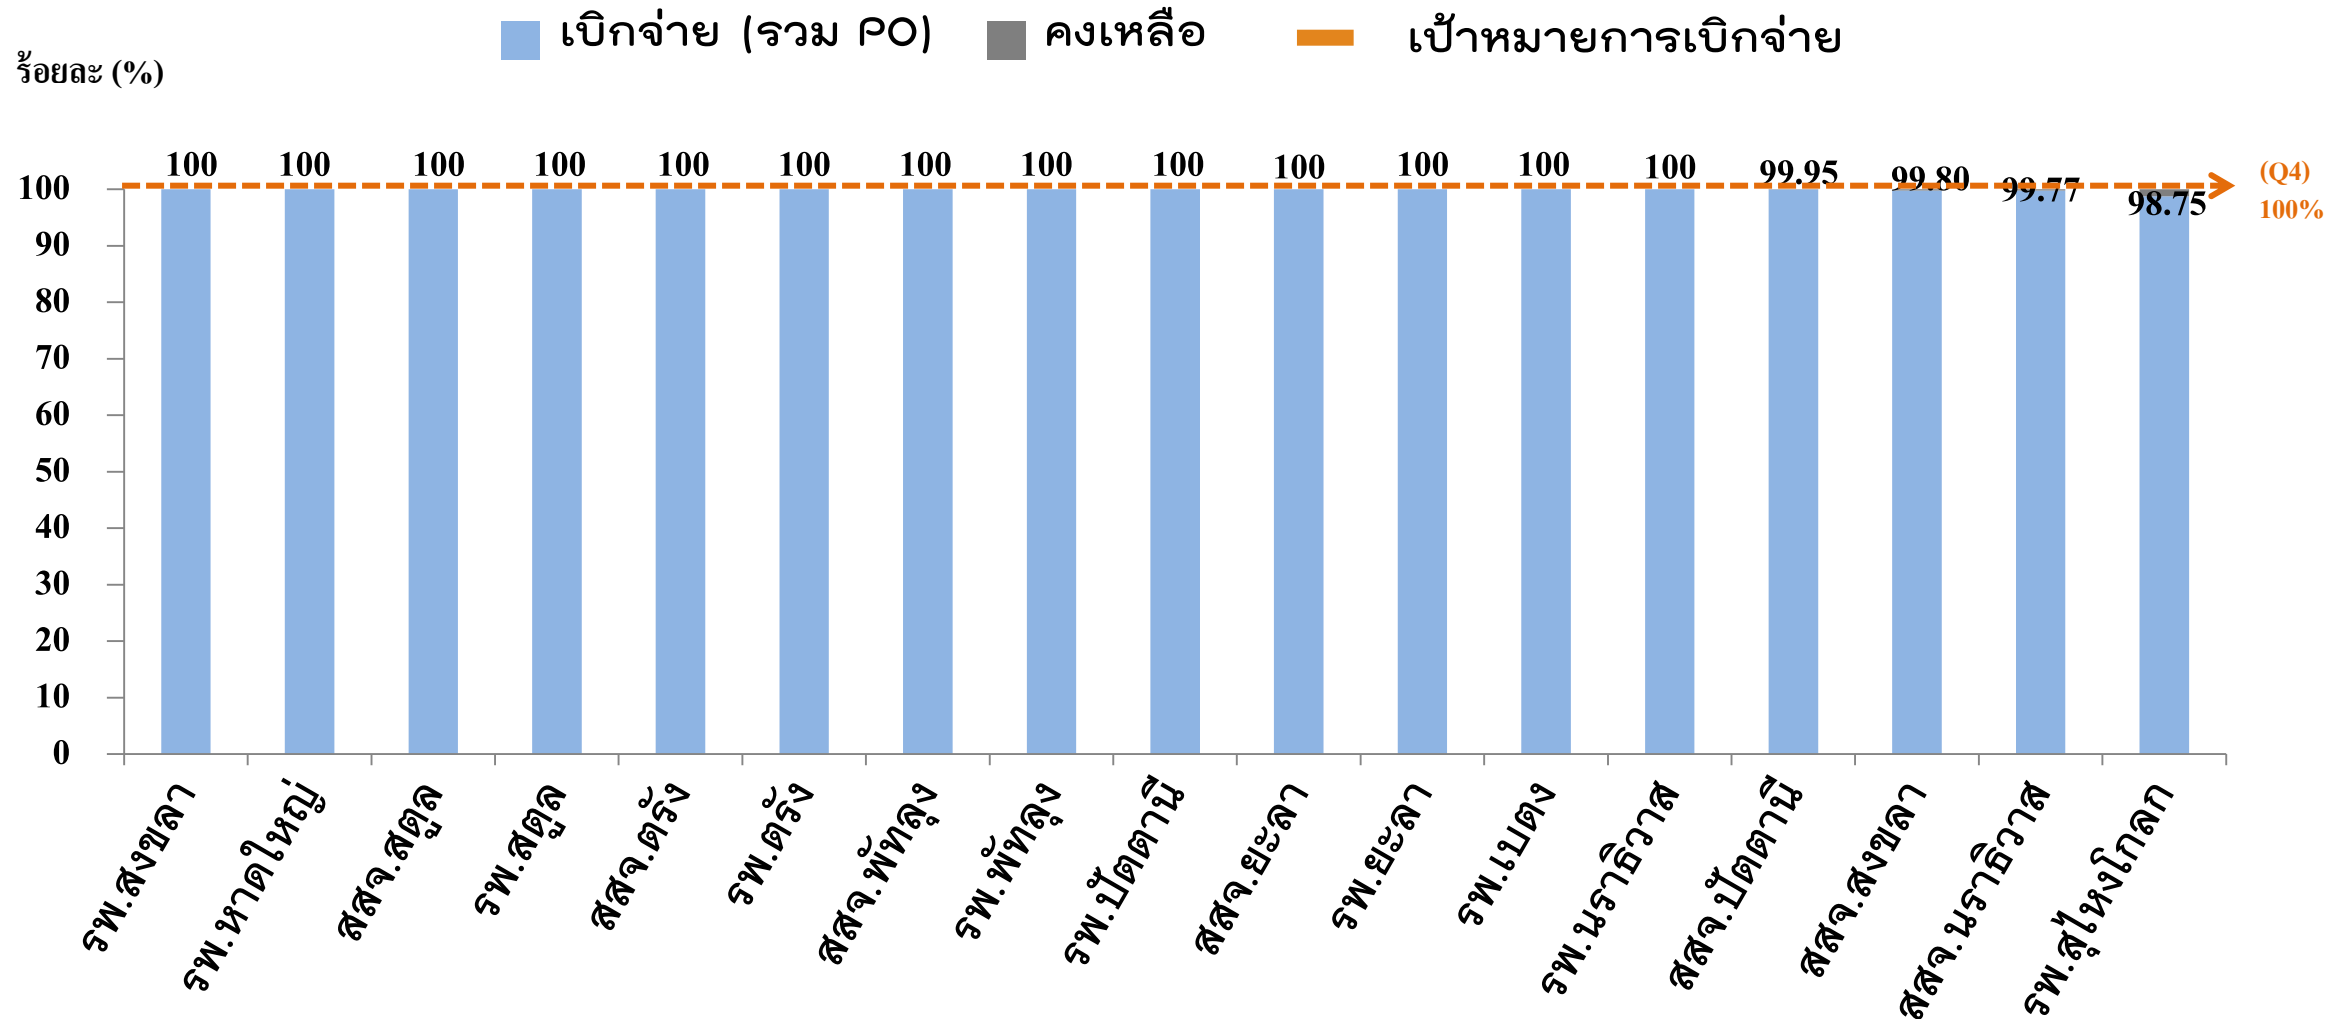

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


ผลการเบิกจ่ายเงิน (GFMS)

งบดำเนินงาน

ปี 2562

■ เบิกจ่าย (รวมผูกพัน PO) ■ คงเหลือ — เป้าหมายการเบิกจ่าย

ร้อยละ (%)

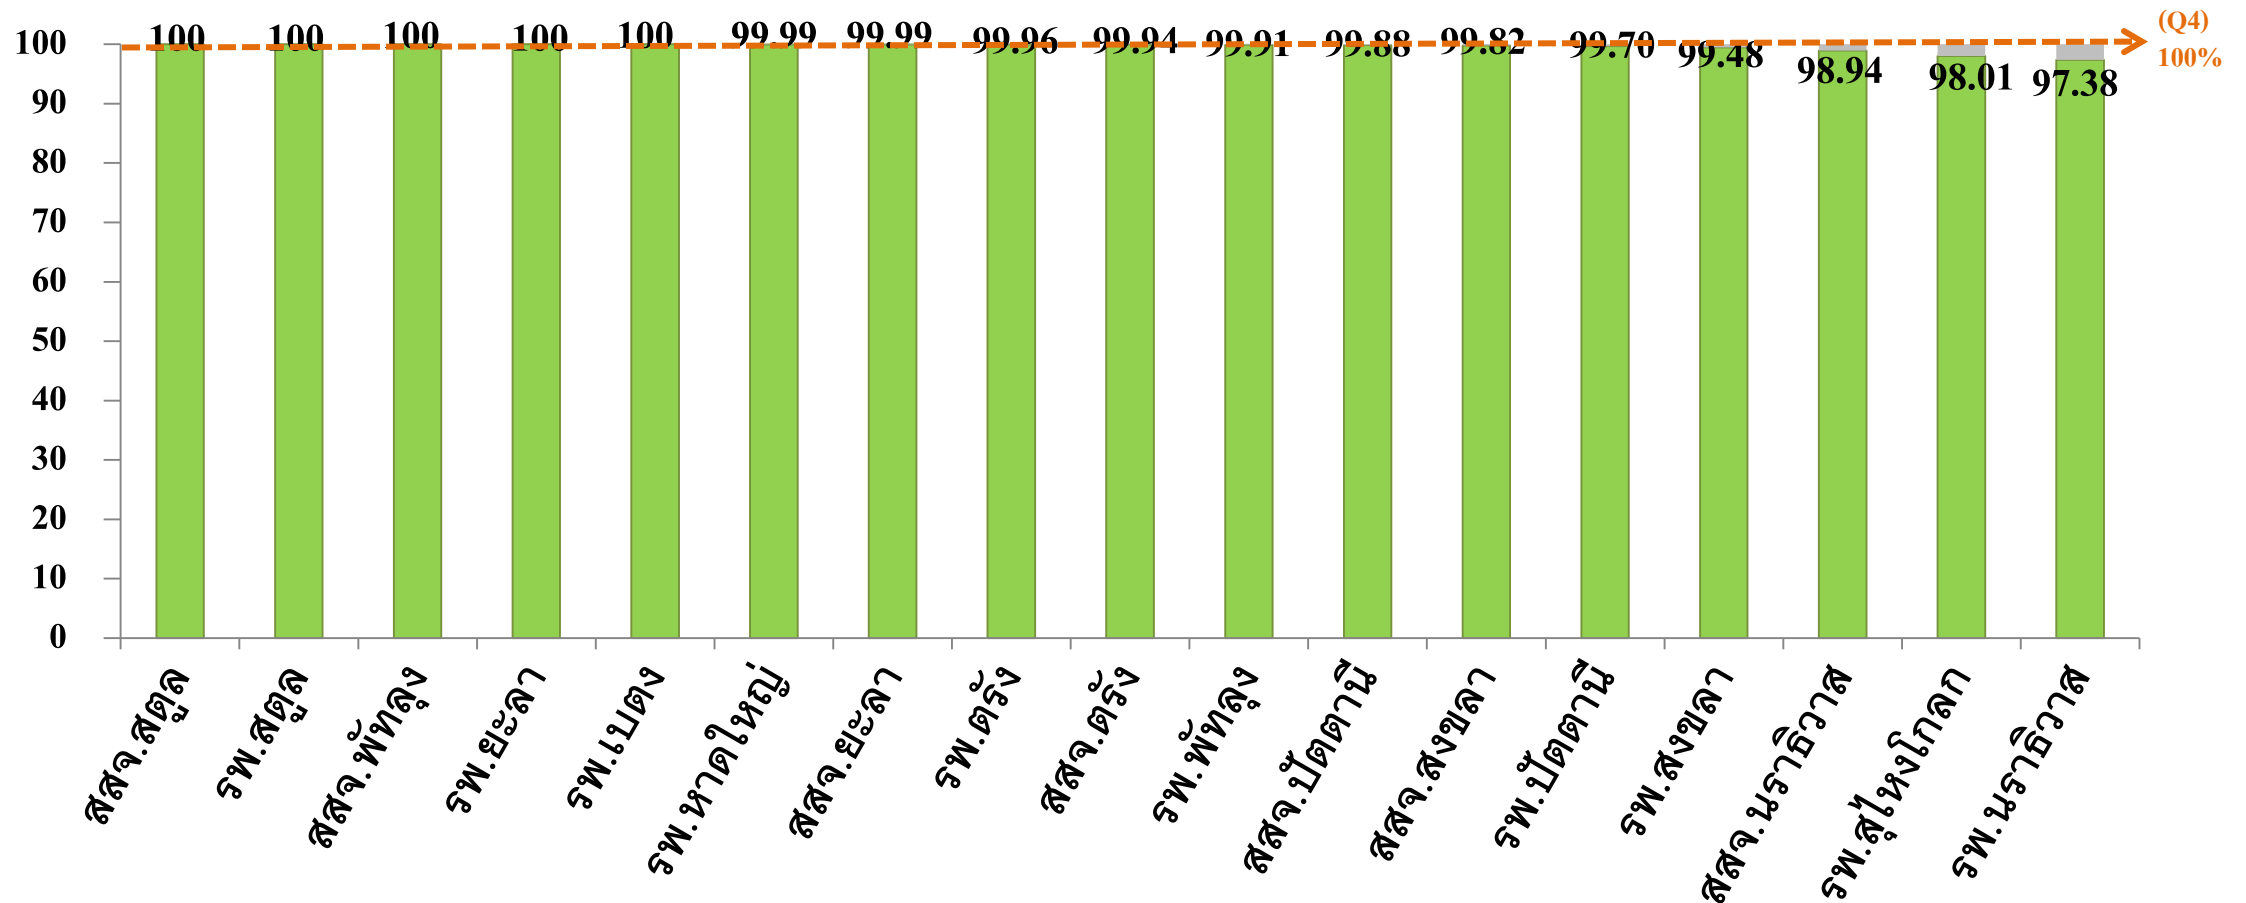


ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผลการเบิกจ่ายเงิน (รายเขต) ปี 2562

งบลงทุน

ร้อยละ (%)


■ เบิกจ่าย (รวม PO) ■ การสำรองเงิน ■ คงเหลือ ■ เป้าหมายการเบิกจ่าย

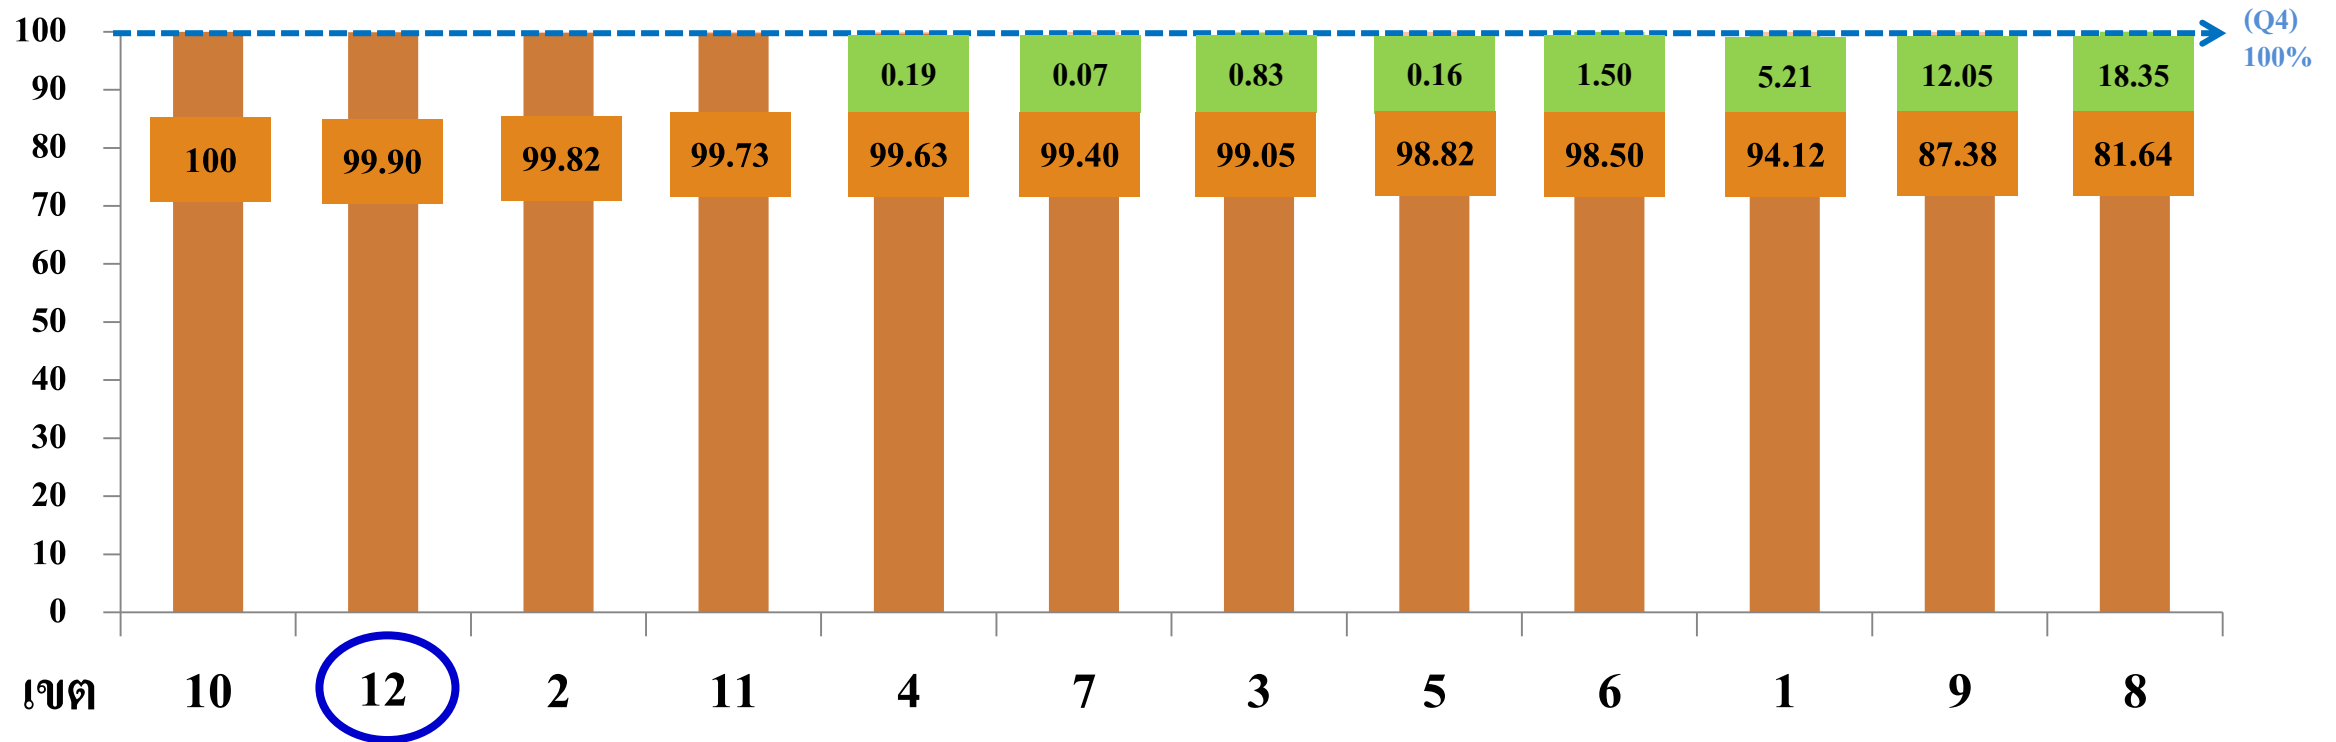

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผลการเบิกจ่ายเงิน (รายเขต) ปี 2562

งบดำเนินงาน

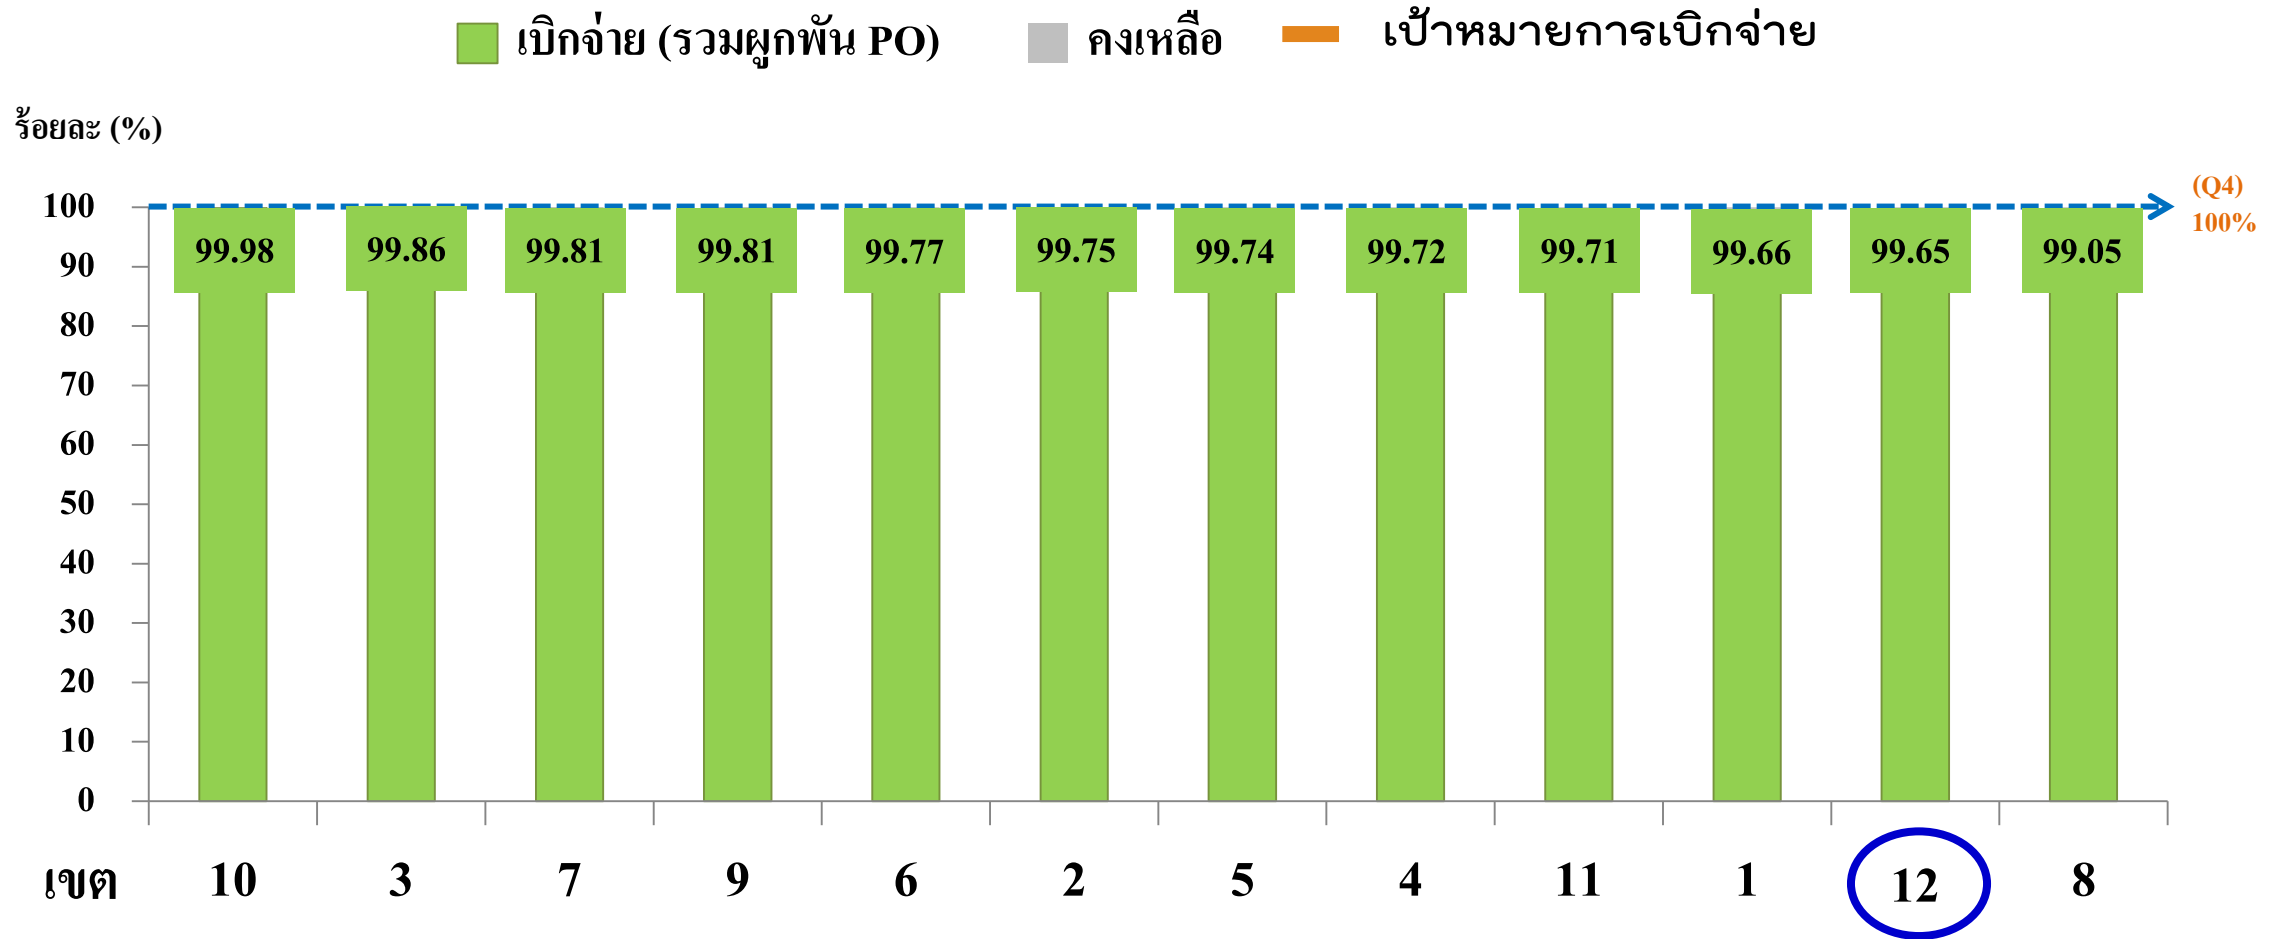

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Thank
you
